

Aan: commissie Waterkwaliteit en Waterketen (WKWK)

Datum: 16-9-2026

Onderwerp: Voortgangsrapportage majeure projecten Waterketen

Voorstel

1. Kennis te nemen van de stand van zaken van de majeure projecten van programma Waterketen en schoon water.

1. Aanleiding

Met deze voortgangsrapportage wordt de AB-commissie Waterkwaliteit en Waterketen (WKWK) geïnformeerd over de stand van zaken van enkele geselecteerde projecten. Het gaat hierbij om projecten van majeure omvang en/of bestuurlijke gevoeligheid, zoals in de Beleidsbegroting 2026 vastgesteld. In de Beleidsbegroting 2026 zijn onderstaande projecten als majeur vastgesteld:

- P069304 Mechanische Zuivering rioolwaterzuiveringsinstallatie Tilburg
- P077007/P077009 Pilot Tilburg nieuwe stoffen (N + P) ten behoeve van medicijnrestenverwijdering
- P077201 Groot onderhoud voorbezinktanks (VBT's) rioolwaterzuiveringsinstallatie Eindhoven
- P084701 Renovatie en uitbreiding slibverwerkingsinstallatie Mierlo
- P085501 Nieuwe stoffen Hapert (Ozon-installatie op de rioolwaterzuiveringsinstallatie)
- P072701 Renovatie rioolwaterzuiveringsinstallatie Haaren
- P088401 Herstel koker 38TS51-TS50 (Zuid-Eindhoven)

Legenda financiële gegevens:

- Totaal krediet: Totale krediet verleend door DB op projectnummer
- Totale realisatie: Totale uitgaven op projectnummer
- Actuele realisatie: Uitgaven t.b.v. realisatie in het betreffende boekjaar
- Inofficieel open (actuele raming): Actuele projectkosten in het betreffende boekjaar
- Officieel BB2026: cijfers zoals opgenomen in beleidsbegroting per boekjaar
- Officieel VN2026: cijfers zoals opgenomen in de voorjaarsnota per boekjaar

2. Toelichting

A. Prestaties

WBP-doel	Project	Opgave	Prognose oplevering
Instandhouden RWZI	P069304 Mechanische Zuivering rioolwaterzuiverings-installatie Tilburg	Nieuwbouw mechanische voorzuivering. Parallel worden nodige instandhoudingsmaatregelen voor de bestaande mechanische zuivering genomen.	2031
Schoon water	P077007/P077009 Pilot Tilburg nieuwe stoffen (N+P) tbv medicijnresten-verwijdering	Pilot Tilburg nieuwe stoffen (N + P)	2027
Instandhouden RWZI	P077201 Groot onderhoud voorbezinktanks (VBT's) rioolwaterzuiveringsinstallatie Eindhoven	Renoveren/ reviseren voorbezinktanks RWZI Eindhoven.	Q2 2027
Instandhouden SVI	P084701 Renovatie en uitbreiding slibverwerkingsinstallatie Mierlo	Renoveren/ reviseren en uitbreiden SVI Mierlo.	Q4 2028
Schoon water	P085501 Nieuwe stoffen Hapert (Ozon-installatie op de rioolwaterzuiverings-installatie)	Het verwijderen van 70% van de medicijnresten.	Q1 2027
Instandhouden RWZI	P072701 Renovatie rioolwaterzuiveringsinstallatie Haaren	Renoveren/reviseren RWZI Haaren	Q1 2028
Instandhouden transportstelsel	P088401 Herstel koker 38TS51-TS50 (Zuid-Eindhoven)	650 meter rioolleiding herstellen van transportfunctie van riool Zuid	Q2 2026

B. Stand van zaken per project/deelgebied


Vervangen Mechanische zuivering rioolwaterzuiveringsinstallatie Tilburg (P069304)

Scope project:

Het vervangen van de mechanische voorzuivering (de objecten waar het afvalwater wordt ontvangen en wordt ontdaan van (grof) vuil en zand). Het DB heeft 8 april 2025 besloten dat Variant 1 (nieuwbouw mechanische zuivering en zandvanger met nieuw leidingwerk naar voorbezinktanks) uitgewerkt kan worden tot een aanbesteding gereed ontwerp, waarna een aanbesteding en realisatie volgt.

De mechanische zuivering heeft geen (direct) effect op de effluentkwaliteit c.q. de KRW-maatregelen. Echter, inname van het afvalwater heeft wel een direct raakvlak met de afnameverplichtingen en de verdere verwerking en behandeling van het afvalwater in de rwzi.


Een parallel traject is gestart om maatregelen te treffen om de bestaande mechanische zuivering met noodmaatregelen in stand te houden, zo lang de nieuwe mechanische zuivering nog niet in bedrijf is.

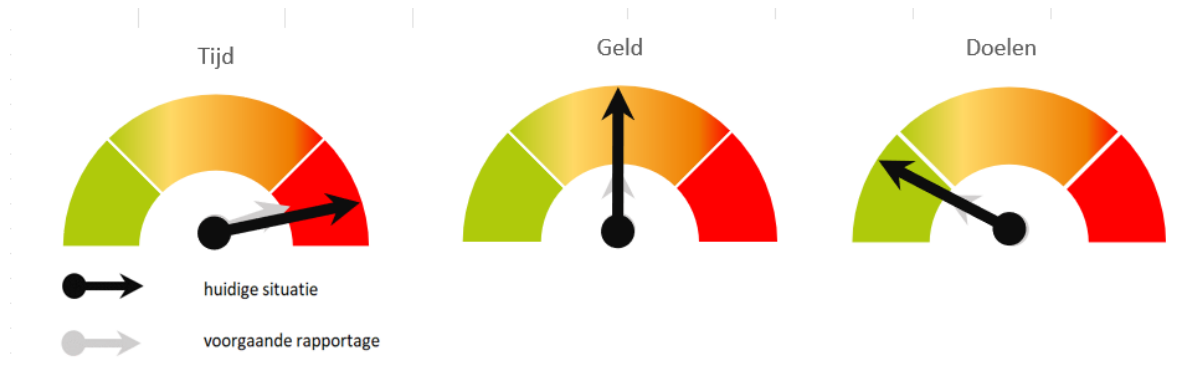


	Commissievergadering 6-5-2026	Commissievergadering 16-9-2026
Tijd	Brabant Water. Met Brabant Water wordt naast mogelijke verlegging van de drinkwatertransportleiding ook overleg gevoerd over een mogelijke uitvoeringswijze van de bouw nabij de drinkwatertransportleiding. Met JZ wordt ook bekeken welke overkomsten mogelijk gemaakt moeten worden voor risico's en aansprakelijkheid op schades. Enexis. Met de gemeente Tilburg wordt momenteel overleg gevoerd met betrekking tot een nieuw gezamenlijk tracé voor elektrische kabels. Provincie. Een notitie en stikstofberekeningen worden	Status 9-7-2026: Vergunning natuurwet (stikstof) De Dommel stuurt uiterlijk augustus een notitie aan de Provincie Noord-Brabant (PNB), waarin onderbouwd wordt toegelicht waarom een "vergunning stikstof" niet vereist is voor het beoogde werk. In de notitie wordt een paragraaf opgenomen voor de urgentie voor vervanging van de mechanische zuivering. Standpunt van het waterschap is dat een 'stikstofvergunning' niet nodig is omdat het een één-op-één vervanging van een bestaand object betreft. De functie, hoeveelheid afvalwater en emissie hiervan wijzigt niet. Het waterschap gaat naar nu door met de ontwerpfase van de vervanging van de mechanische zuivering. Brabant Water. Met Brabant Water is bekeken of de hoofdtransportleiding kan blijven liggen. Er is onderzocht of de ligging van de nieuwe

	voorbereid voor beoordeling door de PNB dat een vergunning natuurwet inzake stikstof niet vereist is in geval van de mechanische zuivering.	mechanische zuivering 3,5 meter verschoven kan worden. Hiervoor moeten enkele assets verplaatst en geamoveerd worden. Een overeenkomst over risico en kosten voor Brabant Water wordt met juridische zaken (JZ) voorbereid. <i>Enexis.</i> Met Enexis wordt een nieuw tracé voor de groengasleiding en voedingskabel voor de rwzi overlegd. Met de gemeente Tilburg wordt momenteel gezamenlijk opgetrokken richting Enexis om de urgentie en wensen kenbaar te maken. <i>Gemeente Tilburg</i> Gemeente Tilburg heeft te maken met een calamiteit in het rioolstelsel en bereidt de realisatie voor van nieuwe aanvoerleidingen, inclusief een overnameput op de RWZI. WDD is betrokken bij het ontwerp van deze overnameput. De gemeente wil de nieuwe leidingen (met een diameter van 2 meter) dieper laten binnenkomen op de RWZI. Dit werkt aanzienlijk kostenverhogend voor de vervangende mechanische zuivering. Vanwege de slechte staat van de influentvijzels vindt overleg plaats over het gezamenlijk ontwerpen en realiseren van een (tijdelijke) pompinstallatie. Deze installatie is ook nodig vanuit de gemeente. Hiermee wordt voor De Dommel beoogd het huidige tekort aan innamecapaciteit en de bedrijfszekerheid beheersbaar te overbruggen tot de nieuwe mechanische zuivering in bedrijf kan worden genomen. In overleg met JZ worden hiervoor overeenkomsten voorbereid.
Geld	De raming is voorbereid voor de VJN2027. Voortschrijdend inzicht in het project maakt duidelijk dat de gasfakkels verplaatst moeten worden. De bestaande locatie van de gasfakkels kan in verband met veiligheid niet gehandhaafd blijven ten tijde van realisatie van de mechanische zuivering. Er dient ruimte te worden gemaakt voor aanleg van de nieuwe verdeelleidingen naar de voorbezinktanks. Verplaatsing gasfakkels is nu in de raming opgenomen. De raming is hoger dan de BB2026 en daarom op oranje gezet..	Ongewijzigd
Doelen	Instandhouden assets en schoon water.	Ongewijzigd

Financieel:

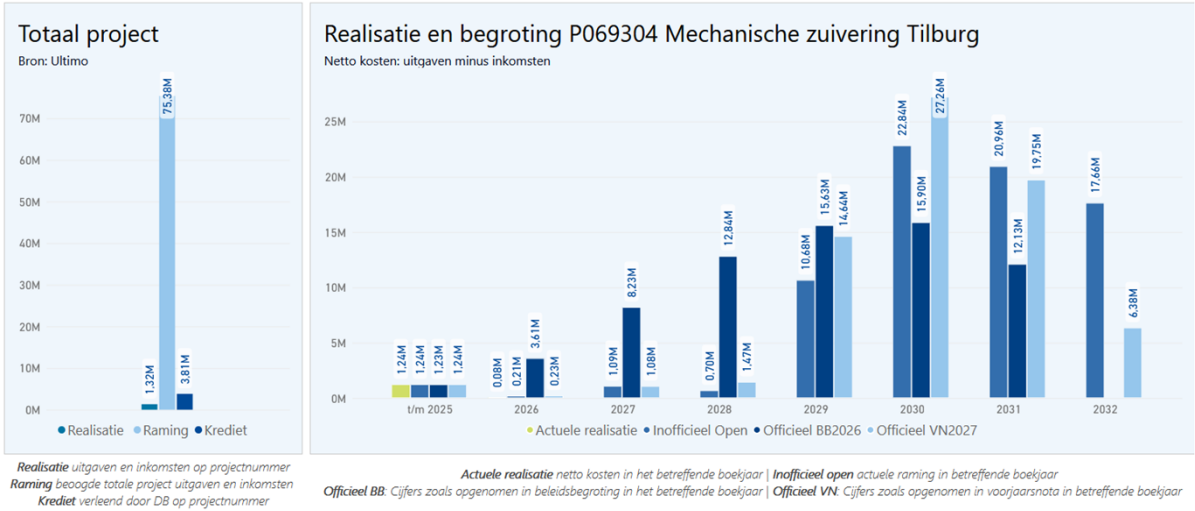


Planning:

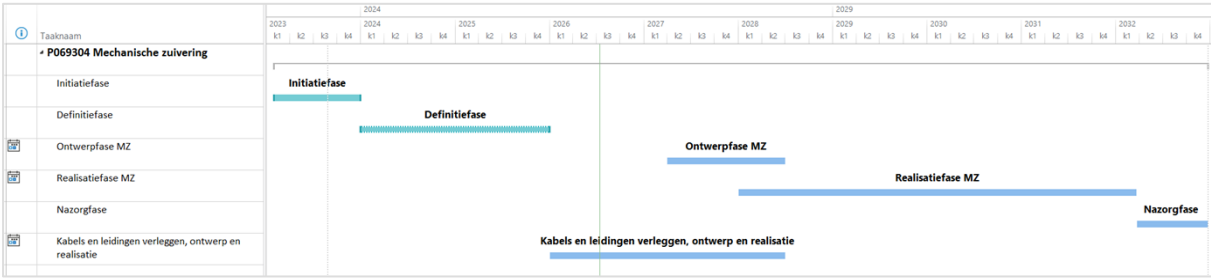

Pilot Tilburg nieuwe stoffen (N + P) ten behoeve van medicijnrestverwijdering (P077007 en P077009)

Scope project:

Dit project draagt bij aan het waterdoel: schoon water. Na de aanpassingen aan de beluchting (P069303) is de effluentkwaliteit sterk verbeterd maar nog onvoldoende om niet belemmerend te zijn voor het behalen van de KRW doelstellingen. Dit vraagt nog extra aanpassingen in de vorm van een 4e trap voor de verwijdering van de nutriënten N + P. Tilburg is ook een hotspot vanuit de Schone Maaswaterketen (verwijderen medicijnresten 70%). In dit innovatieproject worden deze maatregelen gecombineerd om tot een toekomstbestendige oplossing te komen met een zo klein mogelijke klimaatvoetafdruk om hiermee tegelijk onze klimaatdoelstellingen zo goed mogelijk te realiseren. Hiervoor is gebruik gemaakt van een innovatieve aanbestedingsvorm, het innovatiepartnerschap (IPS). Bij het IPS omschrijven we het probleem en de doelstellingen waaraan we moeten voldoen en vragen aan de markt om met een onderbouwde oplossing te komen. Deze oplossing wordt vertaald in een pilot. Gedurende 1 jaar wordt de pilot gemonitord (10-2025 t/m 09-2026). Bij bewezen geschiktheid start de realisatiefase om tot een full-scale installatie te komen¹. De ontwerp activiteiten voor de full scale zouden volgens planning starten in 2026. Op basis van de ontwikkelingen van vergunningen inzake stikstofdepositie en de aanwezigheid van een dassenburcht (natuurwet) is er een significant risico op vertraging van dit traject. Dit najaar worden de mogelijke consequenties in kaart gebracht waarna bestuurlijke besluitvorming hierover plaats kan vinden. Deze rapportage betreft alleen de pilot fase!

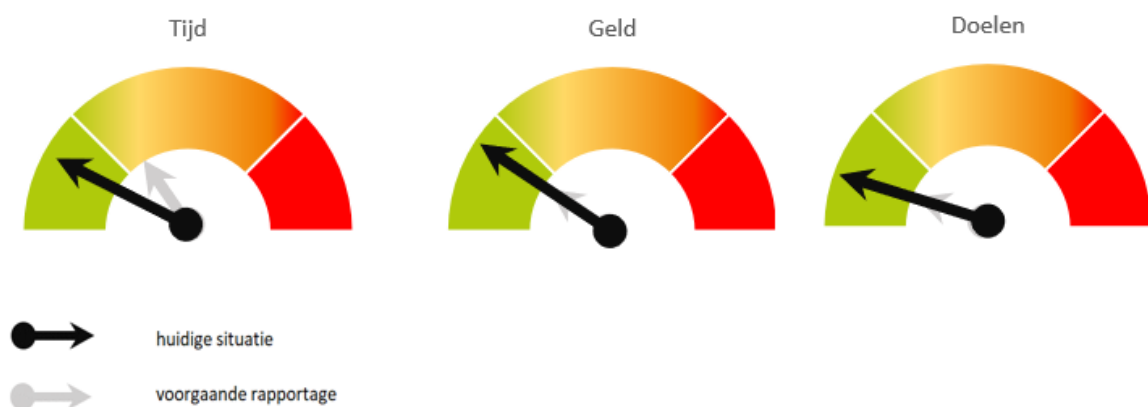


	Commissievergadering 6-5-2026	Commissievergadering 16-9-2026
Tijd	De pilot loopt conform planning. Parallel aan de pilot worden gesprekken gevoerd met de provincie over vergunningverlening van de full scale installatie.	Vooruitlopend op de full scale zijn nu reeds activiteiten ondernomen ter voorbereiding op de full scale. Hierbij zien we een risico ontstaan met betrekking tot de natuurvergunning (stikstofdepositie) en aanwezigheid beschermde fauna (bewoonde dassenburcht). Dit risico kan leiden tot een latere start van de full scale ((nog) geen majeur project). De mogelijke consequenties worden dit najaar ambtelijk in beeld gebracht waarna hierover bestuurlijke


¹ De full scale 4e trap is formeel (nog) geen majeur project (alleen de pilot).

		besluitvorming nog in 2026 plaats kan vinden.
Geld	Om vertraging in de planning van de realisatie te voorkomen zijn een aantal activiteiten in de tijd naar voren gehaald. Hiervoor is budget van het realisatieproject naar voren gehaald. Daarnaast is het onderzoeksbudget verhoogd vanuit de verwachting dat hierdoor de investeringskosten voor de nieuw te bouwen installatie lager kunnen worden.	Uit het verkennend natuuronderzoek is naar voren gekomen dat zich op de beoogde bouwlocatie een bewoonde dassenburcht bevindt. De consequenties hiervan in tijd en geld voor de full scale worden nu nader onderzocht. Samen met de extra inspanningen voor de natuurvergunning zal hierover in het najaar van 2026 een bestuursvoorstel worden opgesteld.
Doelen	Uit de 1e resultaten blijkt dat we met de pilot goed aan de eisen vanuit de KRW kunnen voldoen (verwijdering stikstof en fosfaat). Ook is het 1e beeld van de verwijdering van medicijnresten veelbelovend. Wel is de eerste fase, het zoeken naar de juiste configuratie is met 2 maanden verlengd om de verwijdering van medicijnresten en de bromaat vorming verder te optimaliseren. De verwachting is echter dat de einddatum van oktober 2026 vooralsnog blijft staan.	De optimalisatie voor de verwijdering van bromaat en medicijnresten heeft uiteindelijk 4 maanden gekost ipv 2 maar vanuit de resultaten is de verwachting dat de pilot met aangepaste bedrijfsvoering aan de eisen voldoet en dat daarmee de doelen behaald worden. Dat zal de komende tijd in de duurtestfase worden bevestigd.

Financieel:

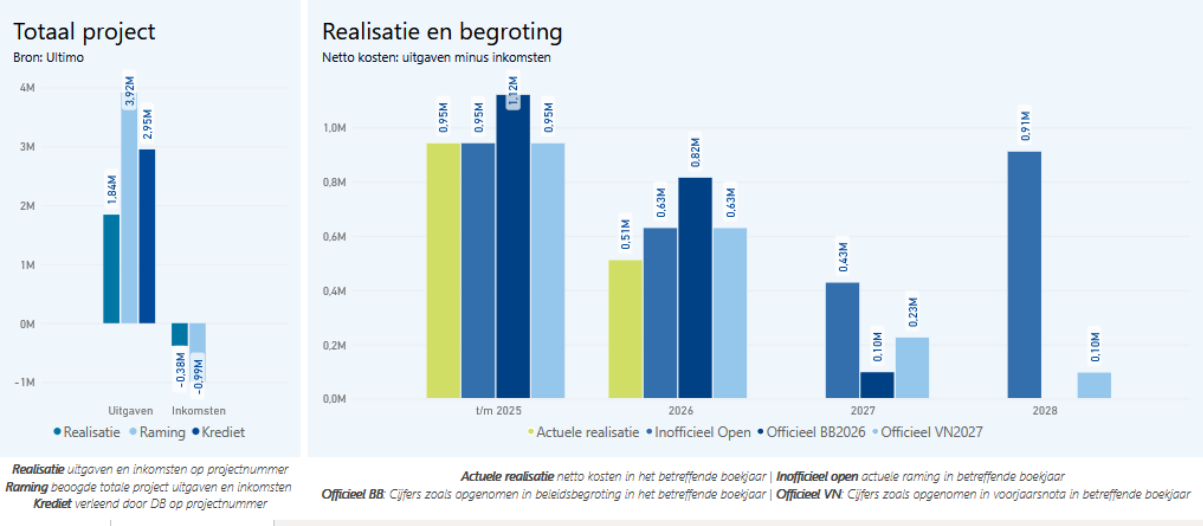

Planning:



----- --> Pilotfase
 ----- --> Full-scale installatie

Groot onderhoud voorbezinktanks (VBT's) rioolwaterzuiveringsinstallatie Eindhoven (P077201)


Scope project:

Dit project draagt bij aan waterketen instandhouden rioolwaterzuivering. Middels groot onderhoud aan de voorbezinktanks zorgen we voor:

- Minimaal 25 jaar restlevensduur.
- Veilige werkomgeving.


Prestaties/resultaat

- Betonreparatie.
- Staalwerk vervangen door RVS.
- Koepel plaatselijk vervangen klinknagels.

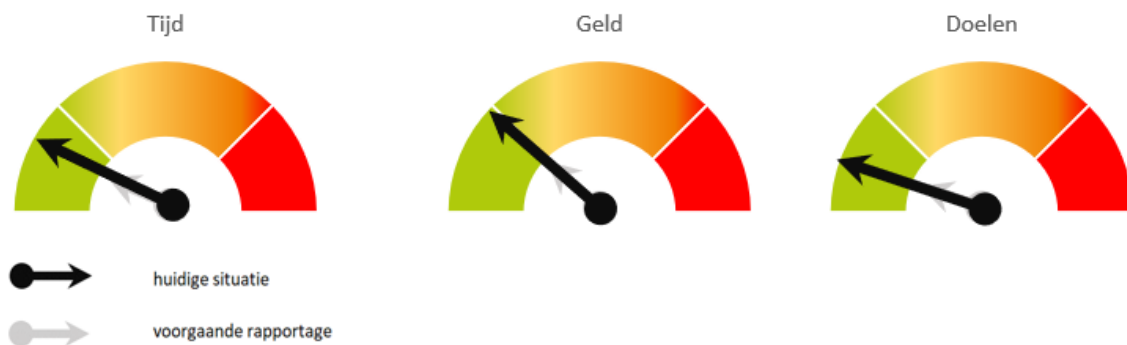


	Commissievergadering 6-5-2026	Commissievergadering 16-9-2026
Tijd	Geen wijzigingen. Prognose VBT1 gereed eind april 2026	Zowel VBT3 als VBT1 zijn afgerond volgens planning. Begin september 2026 opstart van VBT2. VBT2 is de derde en laatste voorbezinktank dit in dit project gerenoveerd wordt.
Geld	Onvoorziene kosten door extra betonreparatie. Wordt gedekt vanuit het projectkrediet. Verder geen bijzonderheden.	Geen bijzonderheden.
Doelen	Dit project draagt bij aan waterketen instandhouden rioolwaterzuivering.	Geen wijzigingen.

Financieel

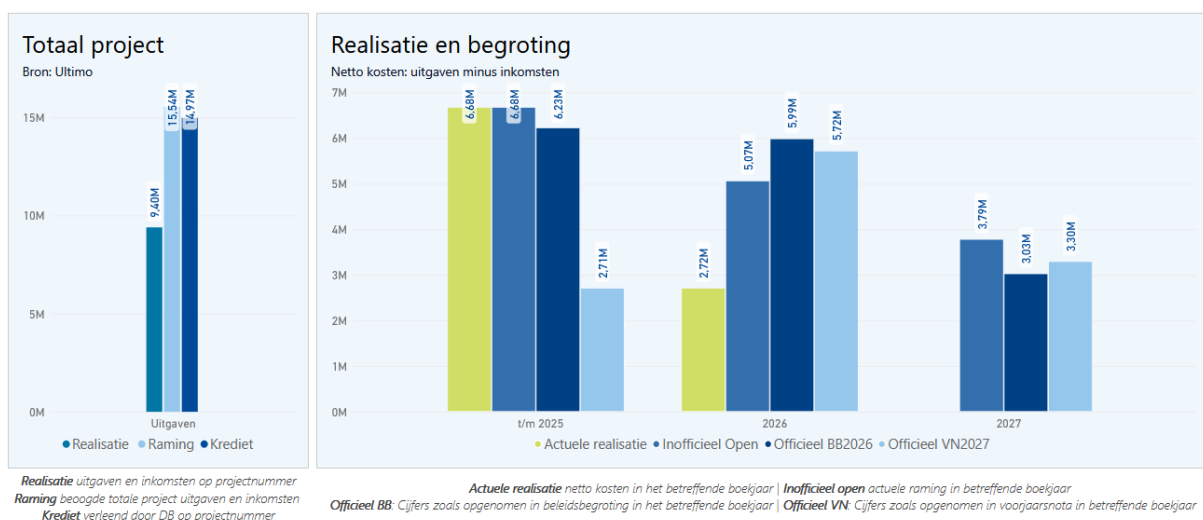

Planning:




Renovatie en uitbreiding slibverwerkingsinstallatie Mierlo (P084701)

Scope project:

Dit project draagt bij aan het doel instandhouden slibverwerkingsinstallatie.


Doelstelling is dat na uitvoeren van de maatregelen de SVI Mierlo in staat is de huidige en toekomstige prestaties te leveren (cf. prognoses 2030 met doorkijk 2050 gebruikt in de toekomstvisie en verkenning) met voor de civiele constructies extra aandacht voor de gewenste capaciteit voor de toekomst. Hiervoor wordt de installatie uitgebreid.

De installatie renoveren/reviseren en/of vervangen zodat deze de gevraagde restlevensduur heeft en voldoet aan wet- & regelgeving (o.a. op gebied van duurzaamheid, arbo en veiligheid).

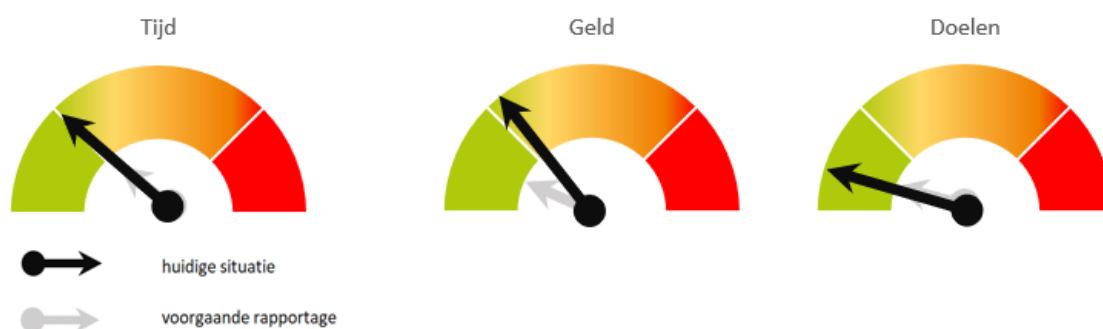

	Commissievergadering 6-5-2026	Commissievergadering 16-9-2026
Tijd	Uitvoering is gestart maart 2026.	Geen bijzonderheden, oplevering staat voor medio 2028.
Geld	Vanwege de toekenning van het uitvoeringskrediet is de wijzer op groen gezet.	Door verschuiving van de jaarschijven (naar voren halen van bedragen) is de bouwrente op het project iets toegenomen.
Doelen	Vertraging (door langere doorlooptijd ontwerpfase) heeft geen effect op het doel. Instandhouding van de installatie/bedrijfsvoering is geborgd middels beheersmaatregelen.	Geen wijzigingen.

Financieel:

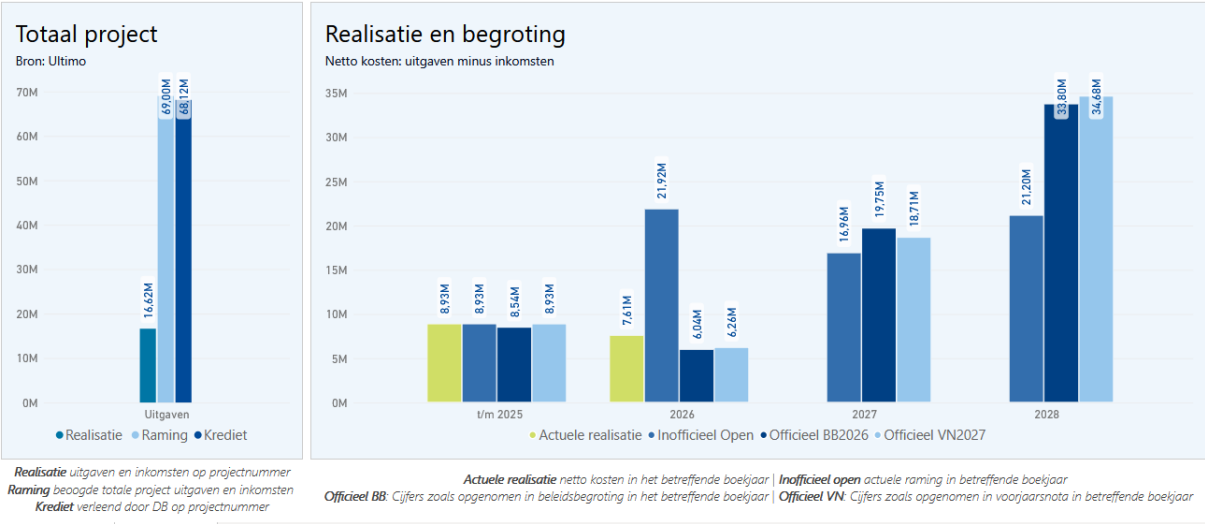


Planning:



Nieuwe stoffen Hapert (P085501)

Scope project


Dit project draagt bij aan het waterdoel: schoon water. Doelstelling van dit project is dat minimaal 70% reductie van nieuwe stoffen (medicijnresten) wordt behaald in het effluent van de RWZI Hapert. Dit doel kan worden gehaald door de realisatie van een ozoninstallatie als nabehandeling. Dat is het belangrijkste deel van de scope. Ook tot de scope van het project behoort het realiseren van een nieuwe laagspanningsruimte en aanpassingen aan de drinkwatervoorziening ten behoeve van de nooddouches (capaciteitsvergroting).

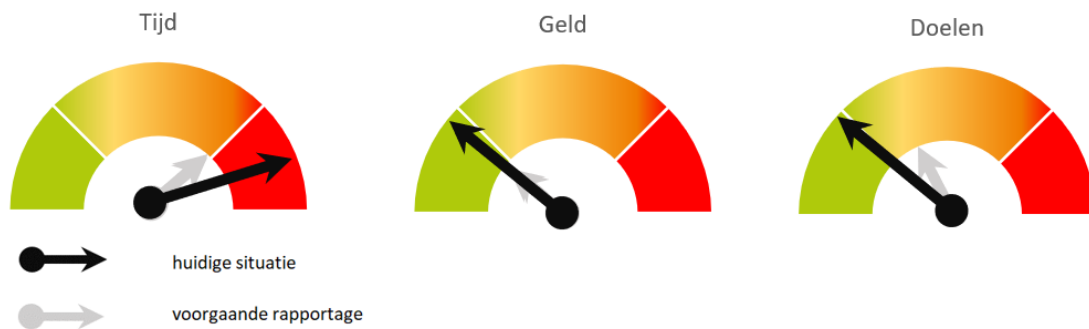


	Commissievergadering 6-5-2026	Commissievergadering 16-9-2026
Tijd	De installatie draait stabiel en de eerste resultaten zijn ontvangen (januari en februari). Zie 'doelen' voor meer informatie daarover.	Vanwege diverse storingen hebben we moeten constateren dat de SAT4-periode (planning jan-juni 2026) niet op de juiste wijze is afgerond. Door deze storingen kon de installatie niet stabiel functioneren. In onderling overleg met de opdrachtnemer worden nu diverse wijzigingen uitgewerkt en geïnstalleerd. Dit zal eind augustus zijn afgerond. Daarna is de eis gesteld dat de installatie minimaal 3 maanden zonder storingen moet kunnen functioneren. Daarna zal het werk opgeleverd worden. De verwachting is dat dit in Q1 2027 definitief afgerond kan worden.
Geld	Het projectkrediet is 14,3 miljoen. Met het huidige inzicht blijft het project daarbinnen.	Geen wijzigingen. Optimalisaties die door opdrachtnemer worden voorgesteld zijn voor kosten van de opdrachtnemer.
Doelen	De eerste meetresultaten (4) zijn bekend. De verwijderingsrendementen variëren tussen de 34 en 59%; dat is ruim onder de eis van 70%. Redenen daarvoor zijn een niet goed gekalibreerde DOC-meter (die bepaalt hoeveel ozon wordt gedoseerd) en regen waardoor verdunning optreedt. De DOC-meter is opnieuw gekalibreerd.	Ondanks dat de installatie helaas nog niet stabiel functioneert, zijn er wel voldoende analyseresultaten beschikbaar. Deze voldoen ook aan de subsidie-eisen voor de wijze van bemonsteren. Vanaf maart zien we verwijderingsrendementen van medicijnresten tussen de 71% en 93% over de hele zuivering. De hogere

	Onder RWA-omstandigheden (veel regen) gelden de genomen monsters niet voor het bepalen van de rendementseis ikv subsidieregeling.	rendementen worden gehaald door meer ozon te gebruiken. Ook is de standaardinstelling vastgesteld (0,6 gr O₃); hiermee is de verwachting dat de minimeis van 70% rendement altijd gehaald wordt en dat het gewenste rendement van 80% ook gehaald kan worden (afhankelijk van de omstandigheden). De bromaat concentraties blijven allemaal ruim onder de norm van 1,0 microgram/liter. De hoogste gemeten waarde is 0,26 microgram/l bij een hoge ozondosering. In de meeste gevallen wordt de detectielimiet niet overschreden. In de volgende rapportage zal een grafiek met het verwijderingsrendement worden toegevoegd.
--	--	--

Financieel :

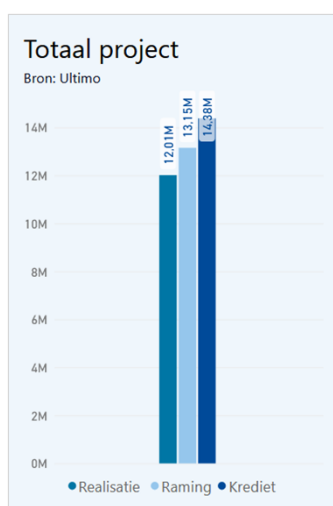


Realisatie uitgaven en inkomsten op projectnummer
Raming beoogde totale project uitgaven en inkomsten
Krediet verleend door DB op projectnummer

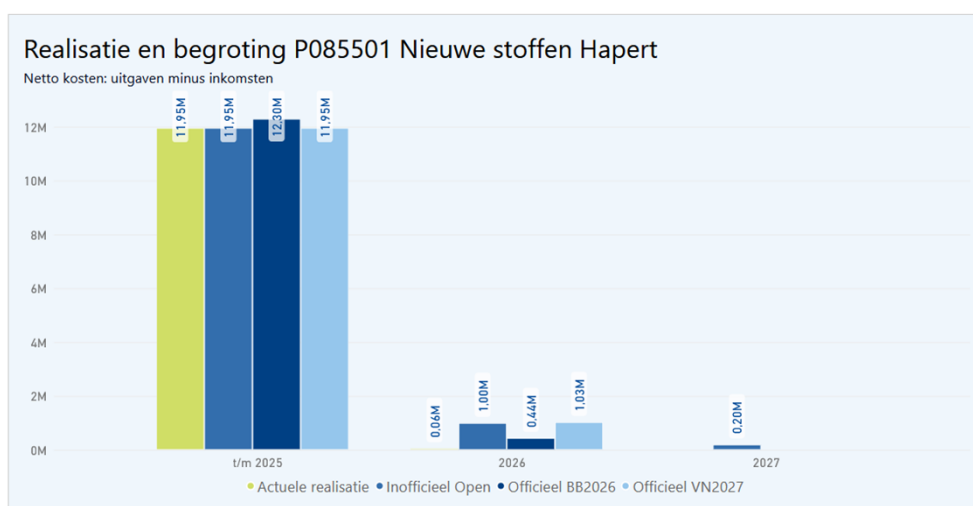

Actuele realisatie netto kosten in het betreffende boekjaar | *Inofficieel open* actuele raming in betreffende boekjaar
Officieel BB: Cijfers zoals opgenomen in beleidsbegroting in het betreffende boekjaar | *Officieel VN*: Cijfers zoals opgenomen in voorjaarsnota in betreffende boekjaar


Planning:



Renovatie rioolwaterzuiveringsinstallatie Haaren (P072701)


Scope project:

Geselecteerde assets van RWZI Haaren worden gerenoveerd en/of vervangen binnen de bestaande civieltechnische constructies met de laagst mogelijke Total Costs of Ownership (TCO) met behoud van functionaliteit en een restlevensduur van 15 jaar.

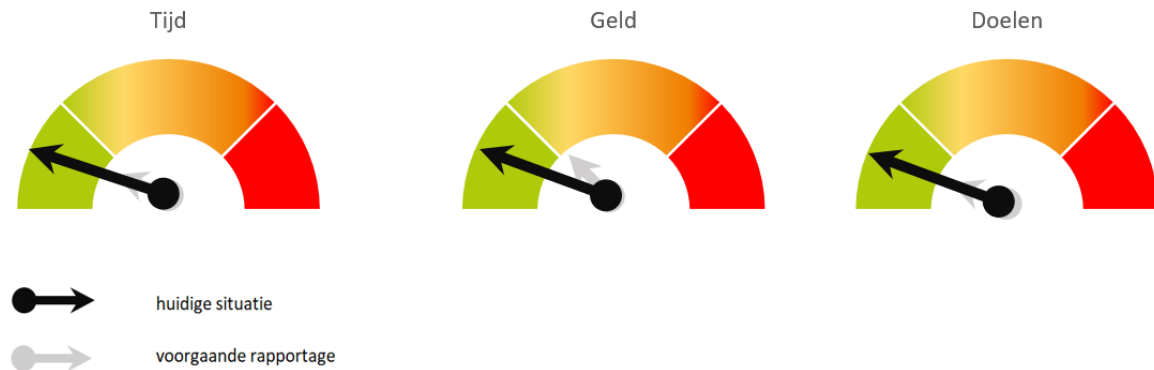


	Commissievergadering 6-5-2026	Commissievergadering 16-9-2026
Tijd	Het DO wordt op dit moment afgerond tot een definitieve versie. Tevens wordt op dit moment gewerkt aan de overeenstemming over de aanneemsom van de realisatieopdracht. Naar verwachting wordt de realisatieovereenkomst begin mei 2026 getekend. Binnen de realisatieovereenkomst wordt tot en met augustus gewerkt aan het UO (Uitvoering Ontwerp). In september 2026 start de realisatie. Op dit moment wordt de planning nog verder geoptimaliseerd. Hierbij wordt gestreefd naar een oplevering eind 2027.	Het DO is afgerond en de realisatieopdracht is getekend. Op dit moment wordt gewerkt aan het UO (Uitvoerings Ontwerp) en wordt de realisatie voorbereid. In augustus 2026 start de realisatie. In de huidige planning wordt gestreefd naar een oplevering eind 2027.
Geld	De concept DO raming is inmiddels ontvangen, deze wordt op dit moment beoordeeld. Bij het vertalen van deze concept DO raming naar projectkosten, komt de actuele raming uit op ca. €27,5 miljoen. In de BB2026 is een reservering van €25 miljoen opgenomen. Nadat de DO raming definitief is, wordt er in april een DB voorstel voorgelegd aan het bestuur.	Bij het vertalen van de aanneemsom naar projectkosten, komt de actuele raming uit op ca. €27,5 miljoen. Er is uitvoeringskrediet verleend voor €24,2 miljoen. Eerder is al €3,4 miljoen aan voorbereidingskrediet verleend. De projectraming past binnen het beschikbare krediet (€27,6 miljoen).

Doelen	Geselecteerde assets van RWZI Haaren worden gerenoveerd en/of vervangen binnen de bestaande civieltechnische constructies met de laagst mogelijke Total Costs of Ownership (TCO) met behoud van functionaliteit en een restlevensduur van 15 jaar.	Ongewijzigd
---------------	--	-------------

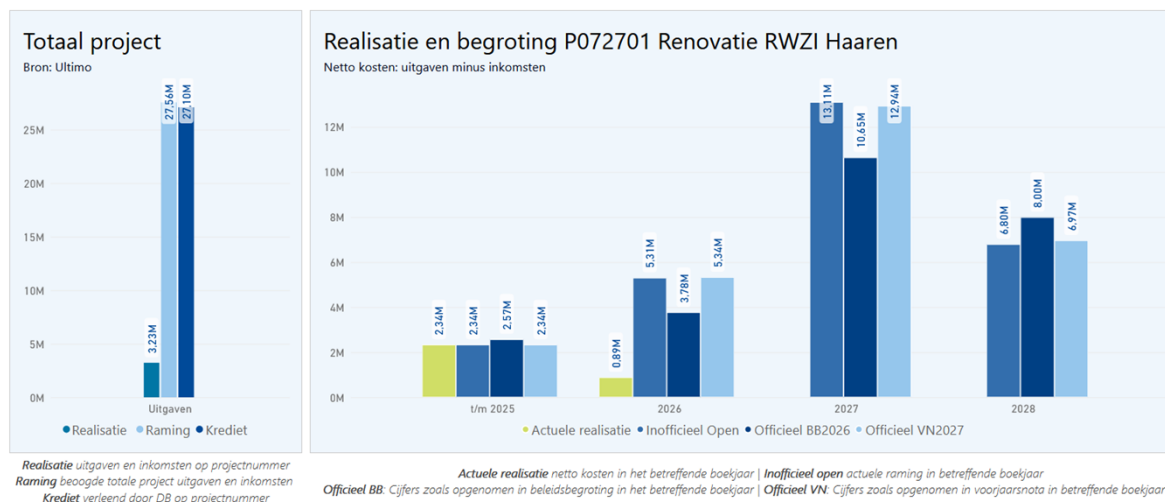


Planning:



Herstel Koker 38TS51-TS50 (Zuid-Eindhoven) (P088401)


Scope project:

Voorjaar 2023 is er schade geconstateerd aan Riool Zuid op golfbaan De Tongelreep nabij put 50. Daaropvolgend is een tijdelijke pompinstallatie (TPI) geplaatst om de waterafvoer te garanderen en als randvoorwaarde om onderzoek en herstelwerkzaamheden uit te kunnen voeren. Bij de inbedrijfstelling van de TPI voorjaar 2024 is er een calamiteit aan de TPI opgetreden. Inmiddels is de TPI herbouwd en worden in bouwteamverband passende herstelwerkzaamheden voorbereid. Omdat er sinds 2014 al meerdere herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd wordt hierbij Riool Zuid tussen put 51 en rioolgemaal Aalst (het gehele golfterrein) over een grotere lengte van 650 meter beschouwd. De ligging van Riool Zuid zorgt voor de nodige uitdagingen vanwege de beperkt beschikbare ruimte en de ligging nabij andere primaire infrastructuur zoals een gastransportleiding en de N2/A2. Daarnaast hebben herstelmaatregelen mogelijk invloed op het functioneren van overstort De Meeren. De voorbereiding gaat in nauw overleg met de grondeigenaar/de golfbaan en andere stakeholders. Figuur 1 toont het projectgebied.

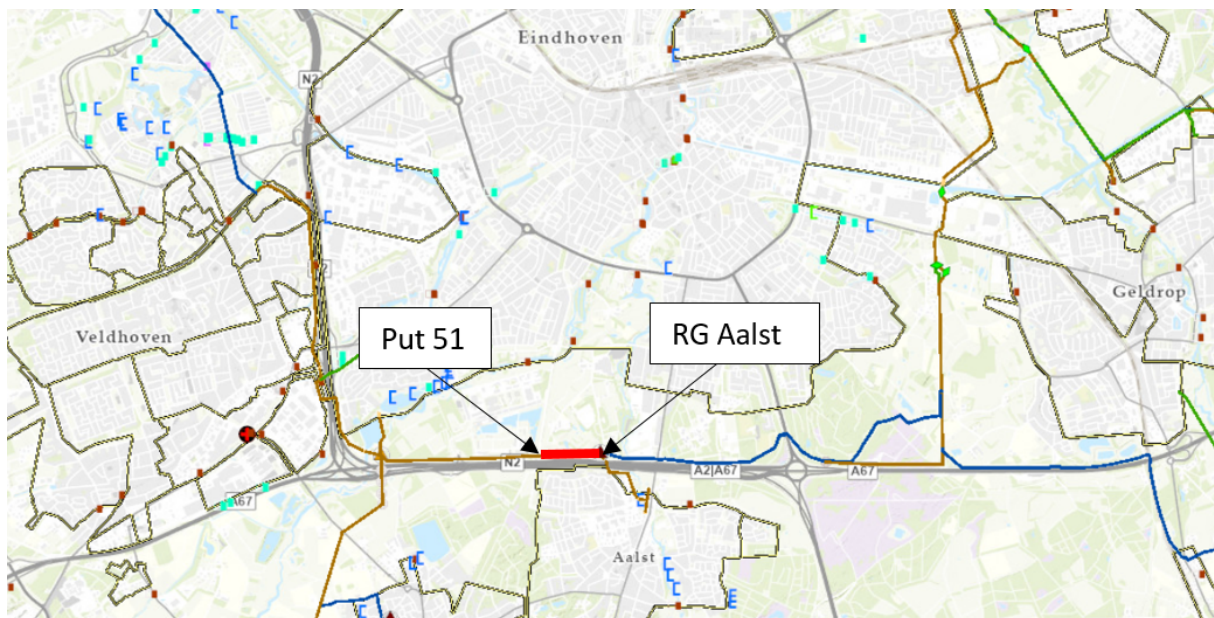


Figuur 1: Projectgebied P088401

Riool zuid en de onderhoudsstatus ervan, is momenteel een zorgpunt voor de organisatie. Niet enkel op deze projectlocatie. Beheer, Onderhoud, Beleid en Innovatie en Realisatie werken intensief samen om instandhoudingsrisico's te beheersen.

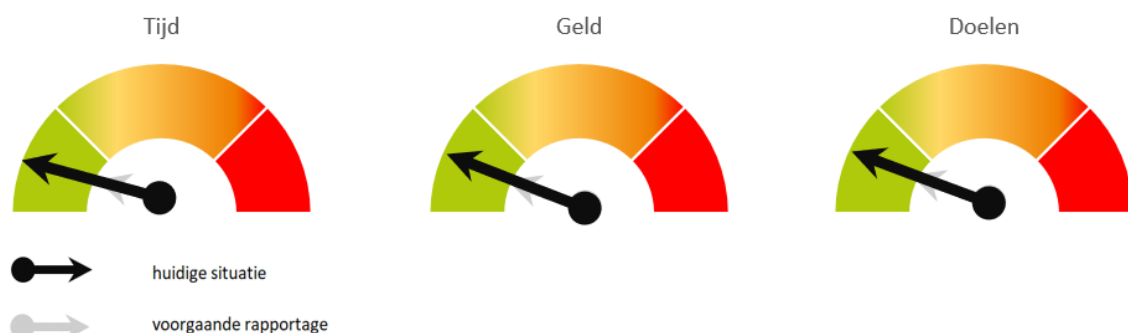

	Commissievergadering 6-5-2026	Commissievergadering 16-9-2026
Tijd	De uitvoeringswerkzaamheden bevinden zich in de laatste fase en verloopt volgens planning. - De samenwerkingsovereenkomst met de golfclub is vastgesteld en ondertekend. Dit is mede mogelijk gemaakt door samenwerking van diverse partijen binnen onze interne organisatie. - Het opleverdossier is in wording en het project wordt dan ook na de laatste financiële afwikkeling afgesloten. Het dashboard blijft daarmee ongewijzigd.	Het opleverdossier is overgedragen vanuit de directievoering aan Proces Onderhoud. Alle acties uit de samenwerkingsovereenkomst met de golfclub zijn uitgevoerd en ook alle hieruit voortvloeiende vergoedingen zijn betaald. De gewijzigde zakelijk recht akte ligt ter verwerking bij de notaris. Het project is eind juni afgesloten. Dit is dan ook de laatste rapportage vanuit het projectteam aan de commissie van dit project. Hierna zal dit project uit de rapportage gehaald worden.
Geld	Nu de uitvoering volgens verwachting verloopt worden de onvoorziene kosten lager ingeschat. Het dashboard blijft daarom op groen	Het project is ruim binnen het verleende krediet afgerond. Het project wordt financieel afgesloten.
Doelen	Doel is het borgen van de vuilwaterafvoerfunctie van Riool Zuid door middel van vervanging van de leiding met een capaciteit van 12.000 m3/uur en volgt daarbij het huidige riooltracé. Deze doelen worden behaald.	Ongewijzigd.

Financiën:

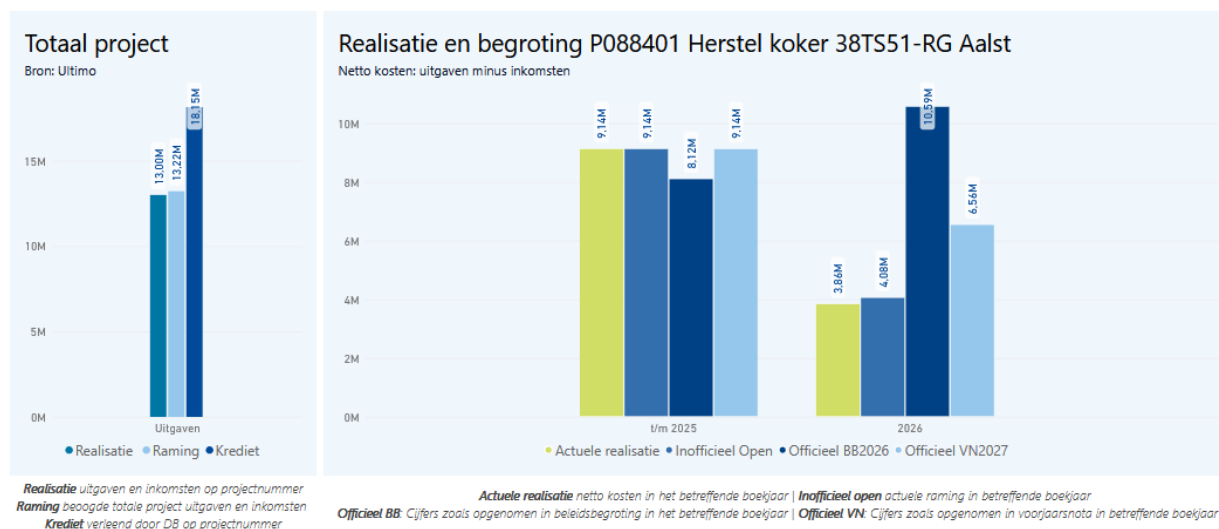

Planning:

Taaknaam	2025										2026						
	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m
➤ P088401 Herstel koker 38TS51-TS50 Riool-Zuid																	
➤ Initiatiefase																	
➤ Definitiefase																	
➤ Ontwerpfase																	
➤ Voorbereidingsfase																	
➤ Realisatiefase																	
➤ Nazorgfase																	
