

Actuele ontwikkelingen majeure projecten Inrichten Watersysteem

Stand van zaken d.d. 1 april 2023

1. Majeure projecten

In de beleidsbegroting 2023 zijn navolgende projecten als majeur benoemd:

- Klimaatrobuust beekdal Sint-Oedenrode
- Beekdalontwikkeling Essche Stroom
- Uitvoeringsprogramma Dommeldal
- Programma Herstel Overige Keringen

Alle hiervoor voornoemde projecten zijn in voorliggende rapportage behandeld op ontwikkelingen gedurende de afgelopen 3-4 maanden.

2. Feiten en cijfers

	Dommel St.O	Dommeldal (bovenloop)	Essche Stroom	Overige keringen
Geld (budgetraming)				
- Uitgaven [M€]	12,5	7,0	10,7	37 ⁴
- Inkomsten [M€]	-5,8	-3,5	-3,5	-
- Netto kosten [M€]	6,7	3,5	7,2	37
Tijd (realisatieperiode)	2023- 2024	2025- 2029	2023- 2024	2023- 2035
Impact (resultaten)				
- NNP [ha]	-	895	70	-
- Inrichten waterlopen [km]	1	4,5	6,7	-
- Vismigratie [n]	-	2	3	-
- Integrale GGOR [ha]	-	-	100	-
- Keringen [stuks]	1*3	-	2,4	84
- Waterberging [ha]	-	-	-	-
- Natuurnetwerk Brabant [ha]	6	274	50	-
- Natura200/PAS	-	✓	-	-
- Agrarische structuurversterking [-]* ¹	✓	✓	✓	-
- Klimaatrobuust beekdal [-]* ²	✓	✓	✓	-
- Mooi water/recreatie [-]	✓	✓	✓	✓

1. Agrarische structuurversterking: o.a. Ondernemend NNB, grondruilingen/verplaatsingen, agro-toerisme
2. Klimaatrobuust: o.a. maatregelen Actieplan Leven-De-Dommel en verbreding waterconservering op flanken
3. Projectresultaat was aanvankelijk realisatie 1,2 km regionale kering. Door huidige klimaatscenario's bleek de realisatie van 1,2 km regionale kering geen effectieve maatregel en is via een gebiedsgerichte aanpak de projectscope verbreed naar klimaatrobuuste inrichting van het beekdal.
4. Uitvoeringsprogramma Overige Keringen: WBP5-planperiode netto budgetraming 10,3 M€

3. Klimaatrobuust beekdal Sint-Oedenrode

De gemeente Meierijstad en Waterschap De Dommel hebben een plan ontwikkeld voor de klimaatrobuuste inrichting van het beekdal van de Dommel in Sint-Oedenrode om:

1. De bebouwde kom van Sint-Oedenrode te beschermen tegen overstromingen vanuit de Dommel.
2. Te zorgen voor voldoende water in de Dommel bij extreme droogte en het tegengaan van verdroging.
3. Een ecologische verbindingszone te maken door Sint-Oedenrode.

Actuele ontwikkeling:


- Er is nog geen zicht op een behandeldatum/zitting bij de Raad van State op het definitief projectplan.
- Zitting beroep bestemmingsplan Sportpark De Neul op z'n vroegst 2^e kwartaal 2023 verwacht.
- De omgevingsvergunning is in procedure gebracht. Er is een zienswijze, die kan leiden tot beroep.
- Baggerwerkzaamheden begin 2023 zijn gereed.
- Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 (POP 3 - Europa) subsidie is beschikbaar (4,3 miljoen euro).
- Belastingdienst heeft ingestemd BTW-compensatie te honoreren voor het deel van de werkzaamheden gepland in de openbare ruimte.

4. Uitvoeringsprogramma Dommeldal (ten zuiden van Eindhoven)

Het Dommeldal ten zuiden van Eindhoven maakt voor een substantieel deel uit van het N2000-gebied 'Groote Heide, Leenderbos, De Plateaux'. Naast de N2000-doelstellingen kent het gebied nog belangrijke andere doelstellingen zoals: realisatie van het Natuur Netwerk Brabant (NNB), behalen van de doelen van de Kader Richtlijn Water (KRW), herstellen van de Natte Natuurparels in het gebied en verschillende brede gebiedsdoelstellingen vanuit de Gebiedsimpuls N69, opgenomen in een Integraal Gebiedsplan. De termijn waarop deze doelstellingen gerealiseerd moeten zijn (vóór 2025 en/of 2027), is vastgelegd in (Europese) wetgeving en verschillende bestuursovereenkomsten gesloten tussen de gebiedspartners. In het uitvoeringsprogramma worden meerdere deelgebieden onderscheiden met elke een eigen planning en aanpak. Voor de Malpie en Elshouters is een grondstrategieplan voor verwerving ten behoeve Natura2000. Binnen deze gebieden is het mogelijk grondeigenaren volledig schadeloos te stellen.

OVERZICHT DOMMELDAL

Van Eindhoven tot Belgische grens

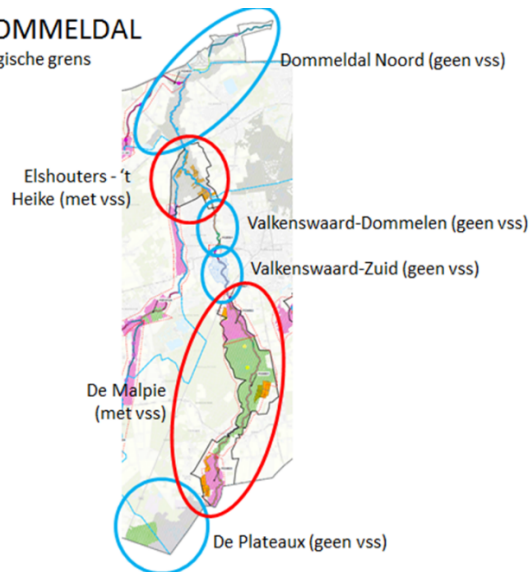

Deelgebieden binnen uitvoeringsprogramma Dommeldal

Actuele ontwikkeling:

- De (Europese) aanbestedingsprocedure van adviesdiensten wordt doorlopen.
- Een start is gemaakt met de voorbereiding op het doorlopen van de ruimtelijke procedures (NRD/MER) voor gehele projectgebied.
- Geen voortgang op verkrijgen van grondbeschikbaarheid.

5. Beekdalontwikkeling Essche Stroom

Waterschap De Dommel werkt al 17 jaar aan een verbetering van het beekdal van de Essche Stroom. Op vele plekken is er in fases gewerkt aan het verbeteren van de waterkwaliteit, een schone waterbodem, het vasthouden en afvoeren van water en aan meer ruimte voor natuur en recreatie. Deelproject Essche Stroom Bruggelaar is het sluitstuk. Het herinrichten van het beekdal tussen de Belversedijk, vlakbij kasteel Nemerlaer, en de stuw in Esch, is de laatste schakel van het gehele Essche Stroom project.

Voor de vaststelling van een definitief projectplan Waterwet is doorgang van een omvangrijk kavelruilproces noodzakelijk. Er was een principe akkoord, echter de voortgang is gestagneerd als gevolg van de 'stikstofdiscussie' en het addendum 7^e actieprogramma Nitraatrichtlijn (KRW). Gesprekken met de grondeigenaren zijn gecontinueerd.

De voorbereiding op uitvoering is bezig. Gekozen is voor het opstellen van een bouwteam, waarbij de aannemer nu reeds betrokken raakt bij de voorbereidingen en hierdoor samen gezocht wordt efficiency en beheersing van de projectdoorlooptijd en uitvoeringskosten.

Actuele ontwikkeling:

- Er is nog geen handtekening van eigenaren onder de kavelruilingen. Eigenaren wachten af.
- Gekozen is voor voorbereiding gericht op realisatie in 2 uitvoeringsfasen. In de tweede fase worden maatregelen getroffen op de nog beschikbaar te verkrijgen percelen. In de eerste fase worden maatregelen getroffen gericht op KRW-doelstelling vismigratie, inrichting zijwatergangen en herstel natte natuurparels.
- Het bouwteam (opdrachtgever+opdrachtnemer) werkt aan een kostenstrategie om de kosten voor grondverzet en – afvoer te minimaliseren.

6. Programma Herstel Overige Keringen

Het herstelprogramma overige keringen staat vast in het vijfde Waterbeheerprogramma (WBP5) 2022-2027. Het programma komt uit de verkenning naar de staat van de overige keringen in 2021. Eerst worden de overige keringen aangepakt die het grootste risico op wateroverlast en schade hebben. Na detailanalyse en her-clustering van de aanvankelijke opgave (programmaperiode WBP-5) onderscheiden we nu 10 deelprojecten (4 clusters):

- Cluster 1: Bossche Broek Zuid, Bossche Broek Noord en Halder – Volmeer
De deelprojecten lopen voorop in het uitvoeringsprogramma. Start uitvoering is voorzien in jaar 2024.
- Cluster 2: Van Salmstraat Boxtel, De Rulse Hoeve Heeze, Rummeling Maarheeze:
De deelprojecten kennen na inmeten en nadere probleemanalyse een beperkte herstelopgave en kunnen al in 2023 weer worden overgedragen aan de beheerorganisatie(s).
- Cluster 3: Onderhoud regionale kering Klotputten, Eindhovens kanaal, Logtse Baan - Logtse Velden:
De deelprojecten staan voor de uitvoering gepland in periode 2025-2026. Voor de deelprojecten Eindhovens Kanaal en Logtse Baan – Logtse Velden is afstemming met onze gebiedspartners van belang. Voor het Eindhovens kanaal zijn dit de gemeenten Eindhoven en Helmond en waterschap Aa en Maas. Voor Logtse Baan – Logtse Velden is dat met Natuurmonumenten.
- Cluster 4: Hoogwaterbescherming Vught e.o. (+ relatie met HoWaBo)
Dit deelproject omvat de hoog prioritaire waterkeringen Pestdijk, Volmeer-Bleijendijk en Beukenhorst en de laag prioritaire keringen Halse Broek/-Beemden en Esch (noordoostzijde Essche Stroom). Deze waterkeringen spelen een rol bij de hoogwaterbescherming van Vught e.o. in geval van een HOWABO-situatie. Onderzocht wordt of een gesloten stelsel van regionale keringen een passend antwoord zou zijn op de recente hydrologische inzichten. Besluitvorming is in voorbereiding en zal moeten plaatsvinden in het licht van HOWABO2.0.

Actuele ontwikkeling:

Cluster 1: Bossche Broek Zuid, Bossche Broek Noord en Halder – Volmeer:

- Inkoopstrategie is ontwikkeld en voorbereiding op aanbesteding is gestart.

Cluster 2: Van Salmstraat Boxtel, De Rulse Hoeve Heeze, Rummeling Maarheeze:

- Geen bijzonderheden.

Cluster 3: Onderhoud regionale kering Klotputten, Eindhovens kanaal, Logtse Baan - Logtse Velden:

- Geen bijzonderheden.

Cluster 4: Hoogwaterbescherming Vught e.o.:

- De waterschappen Aa en Maas en De Dommel hebben afspraken gemaakt te starten met de voorbereidende studies. Het Waterschap de Dommel geeft uitvoering aan de maatregelen op/in het 'eigen' beheergebied.
- Er wordt toegewerkt om op bestuurlijk niveau een samenwerkingsovereenkomst te sluiten, waarin afspraken worden gemaakt over de verdeling van werkzaamheden en de bekostiging van de plan- en uitvoeringfase.
